

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月05日

計画の名称	春日部公共下水道の整備計画											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	春日部市											
計画の目標	下水道整備により公衆衛生の向上や河川・湖沼等の水質保全・市街地の浸水防除などを図り、安全で快適な生活環境を維持することを目的とする。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,199	A	2,199	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道整備率を96.5%(H27)から98.8%(H31)に増加させる。			
	下水道整備率 整備面積(ha) / 認可面積(ha)	H27 97%	H29 98%	H31 99%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	春日部市	直接	春日部市	管渠(汚水)	新設	春日部第3処理分区分管渠整備事業(八木崎駅前区画整理事業地内)	面整備 31.2ha	春日部市						726		-		
	A07-002	下水道	一般	春日部市	直接	春日部市	管渠(汚水)	新設	春日部第3処理分区分管渠整備事業(花積地内)	面整備 3.9ha	春日部市							152		-	
	A07-003	下水道	一般	春日部市	直接	春日部市	管渠(汚水)	新設	春日部第4処理分区分管渠整備事業(内谷地区)	面整備 19.1ha	春日部市								418		-
	A07-004	下水道	一般	春日部市	直接	春日部市	管渠(汚水)	新設	庄和第1-2処理分区分管渠整備事業(西金野井地内)	面整備 45.2ha	春日部市								903		-
												小計							2,199		
												合計							2,199		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 春日部市公共事業評価監視委員会	事後評価の実施時期 令和 3年 2月 5日
	公表の方法 春日部市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公共下水道の整備を行ったことにより、「計画の成果目標」である下水道整備率の向上が図れたほか、「計画の目標」である公衆衛生の向上や河川等の水質保全に資することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図るため、次期（R2年度からR3年度）社会資本総合整備計画においても、引き続き公共下水道の整備を行っていく。	


目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	下水道整備率		
	最終目標値	99%	A07-001（八木崎駅前区画整理事業地内）、A07-002（花積地内）及びA07-003（内谷地区）については、事業完了した。A07-004（西金野井地内）については、R2年度に本管理設工事が完了、R3年度に舗装本復旧を実施することにより、当該地域の公共下水道整備が完了する予定である。最終目標値と最終実績値の差0.4%（最終目標値98.8%、最終実績値98.4%）については、交通安全策を最優先とした地元要望によりH29年度にA07-004（西金野井地内）の整備年度の計画を見直したため、生じたものである。 目標整備面積（99.4ha） 整備済面積（90.9ha）
	最終実績値	98%	

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

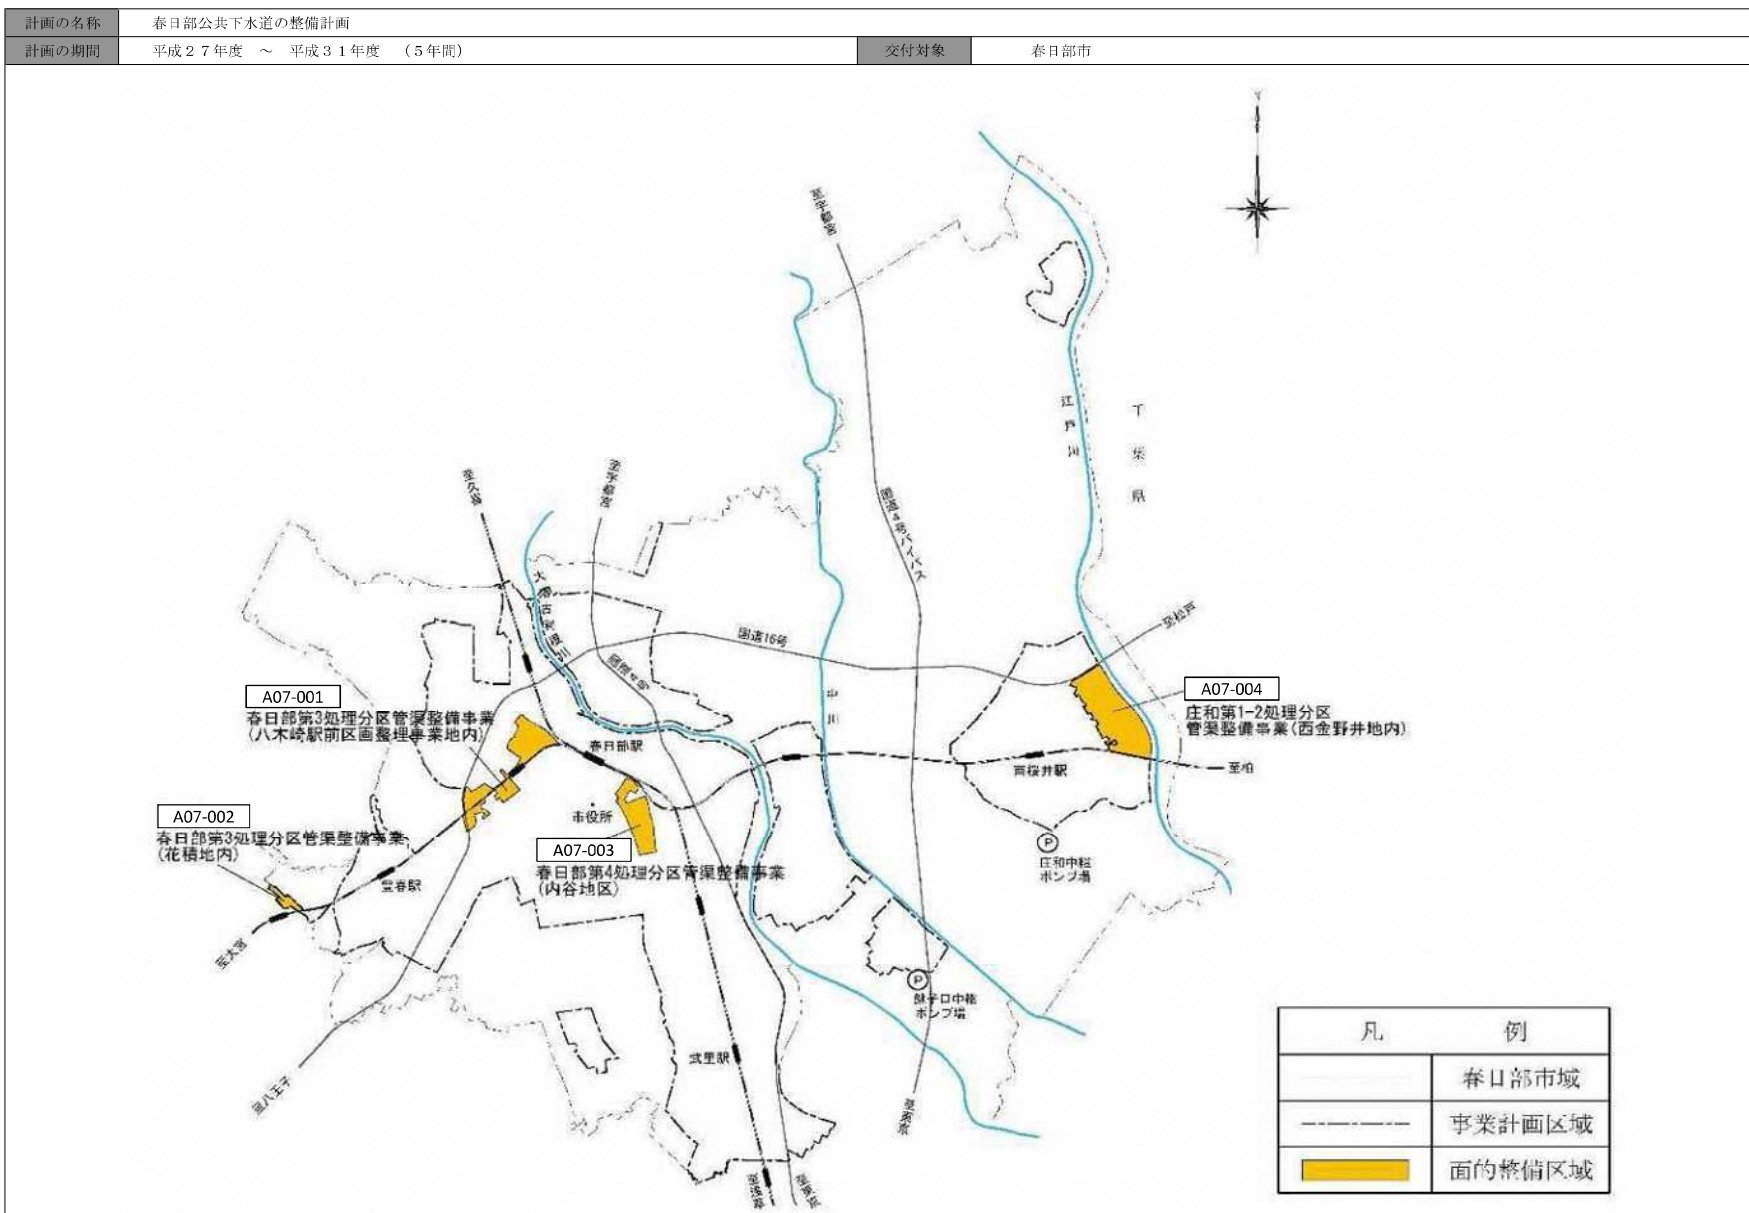

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	春日部公共下水道の整備計画	交付対象	春日部市
計画の期間	平成27年度～平成31年度 (5年間)		

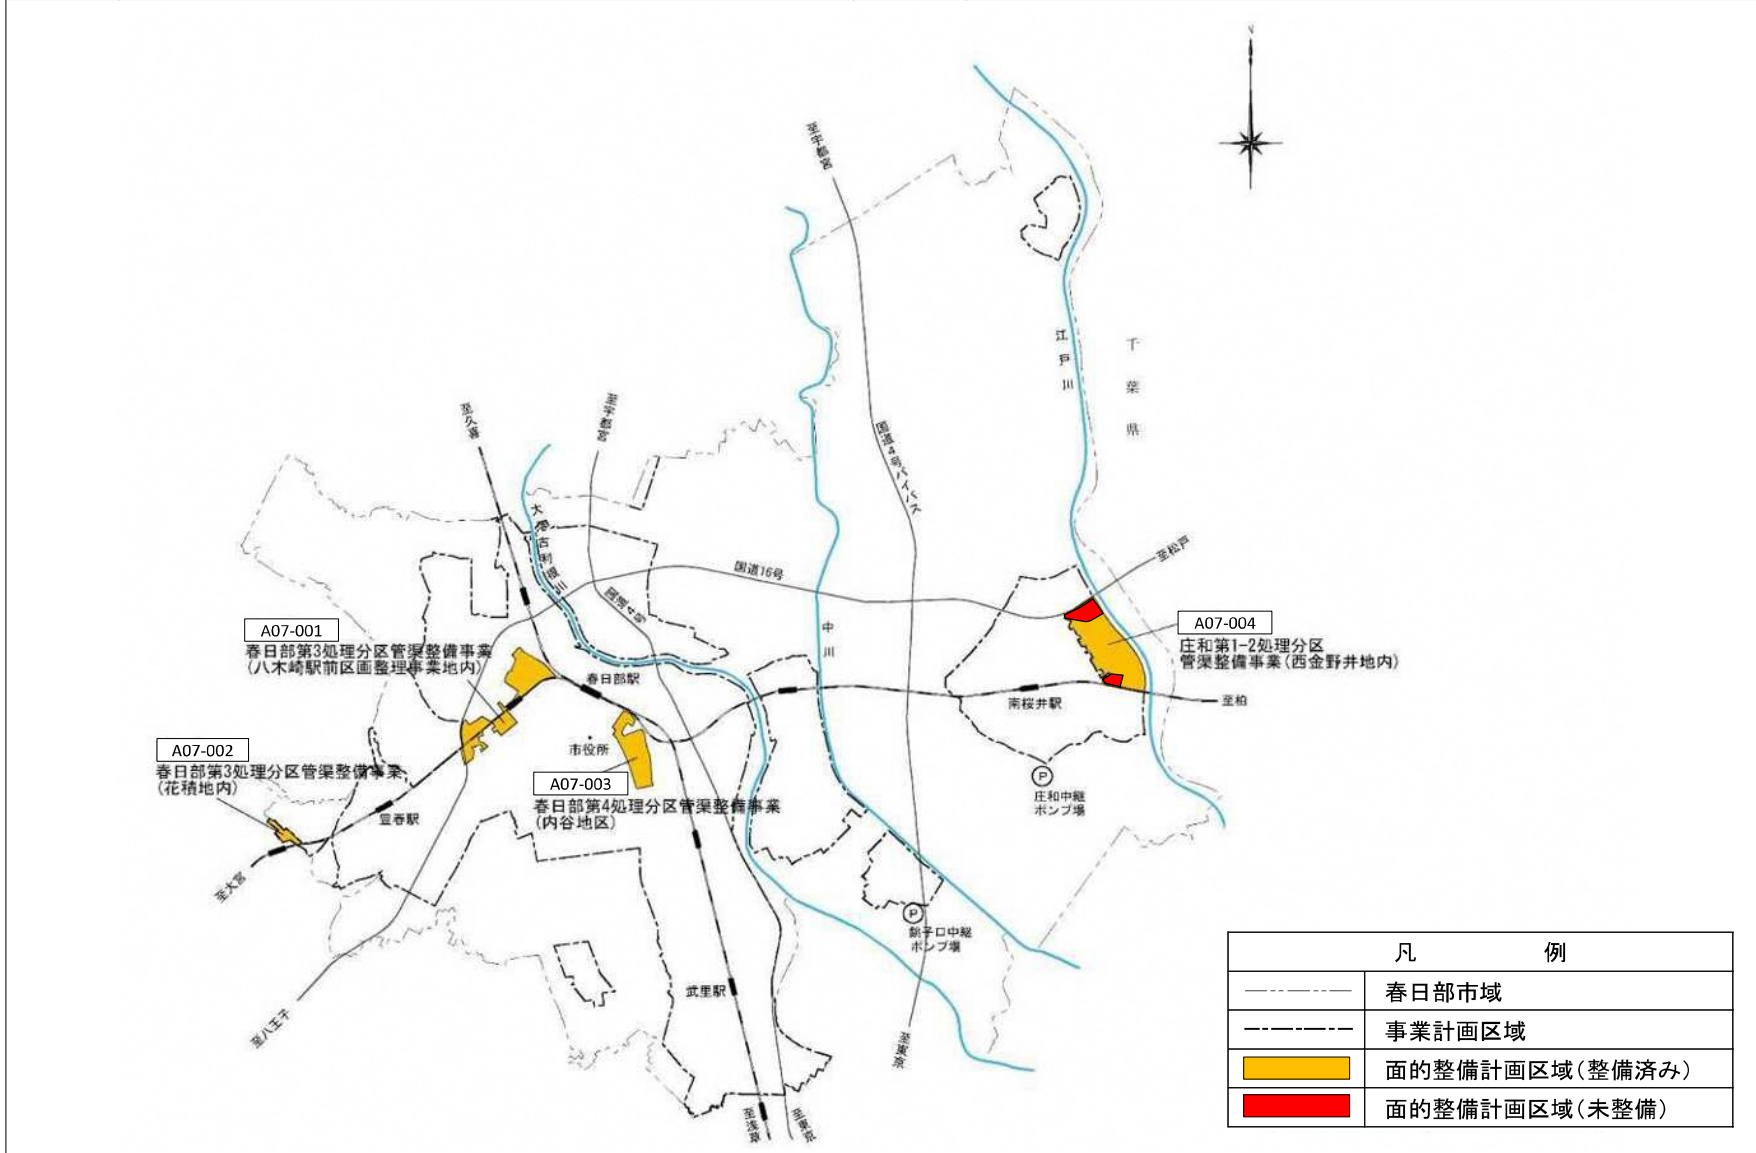


(参考図面) 社会資本総合整備計画

A07-001, A07-002

計画の名称	春日部市における公共下水道の整備		交付対象	春日部市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)			

春日部第3処理分区計画図

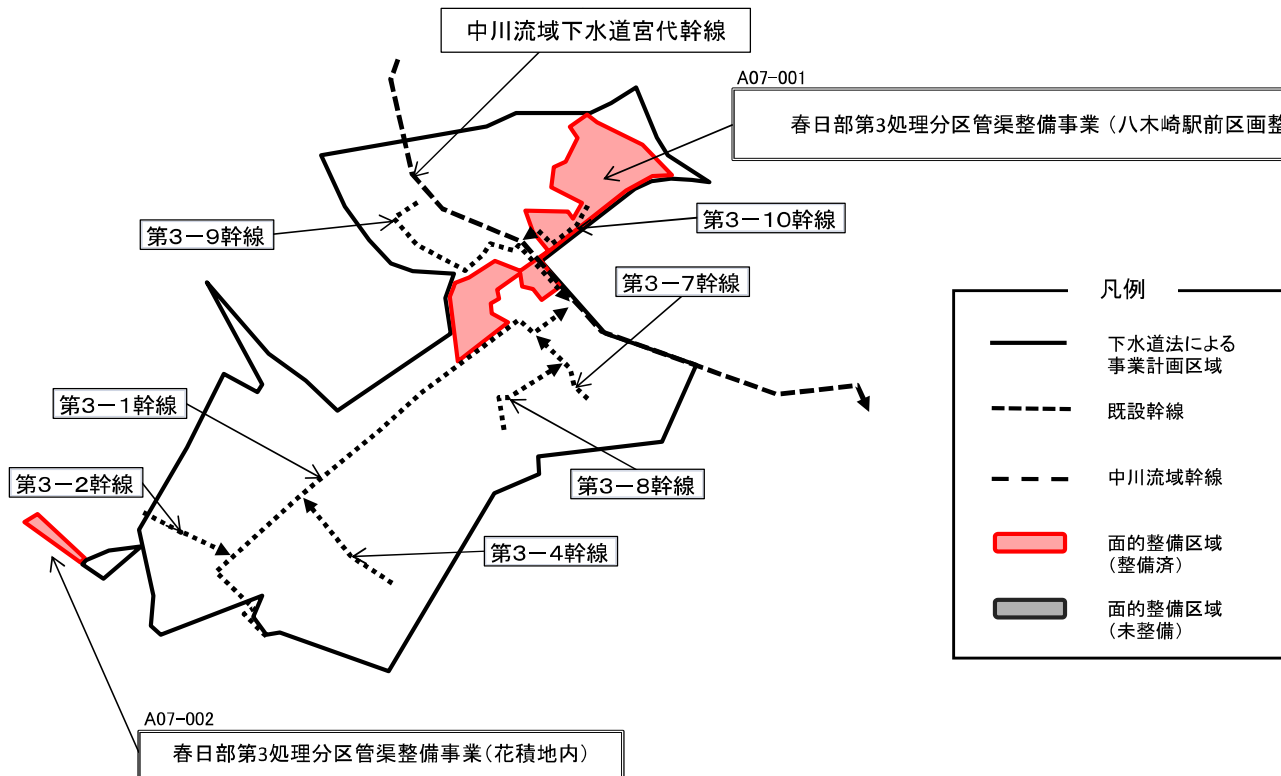


(参考図面) 社会資本総合整備計画

A07-003

計画の名称	春日部市における公共下水道の整備		交付対象	春日部市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)			

春日部第4処理分区計画図

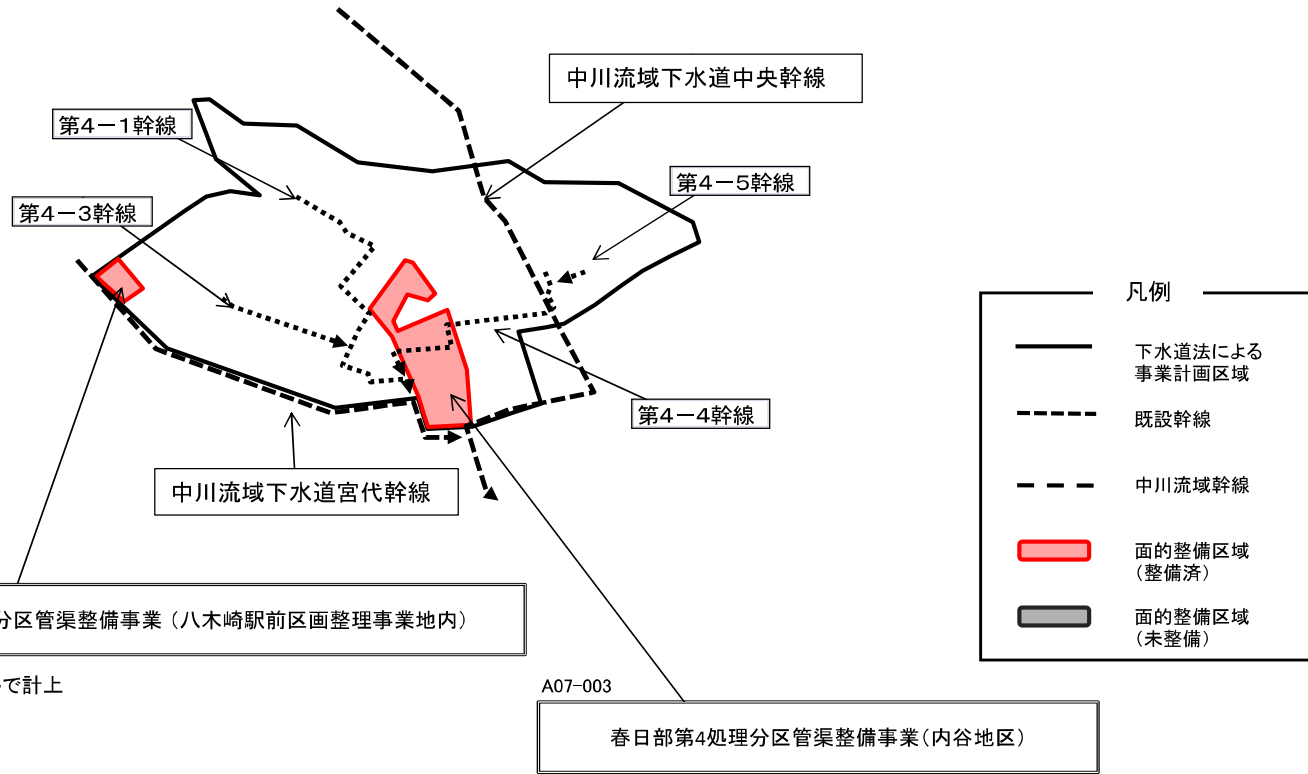

A07-001
春日部第3処理分区管渠整備事業 (八木崎駅前区画整理事業地内)

※第3処理分区に含んで計上

A07-003
春日部第4処理分区管渠整備事業 (内谷地区)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

A07-004

計画の名称	春日部市における公共下水道の整備		交付対象	春日部市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)			

庄和第1-2処理分区計画図

