


春日部消防署武里分署新築工事
~令和5年7月度工事予定のお知らせ~

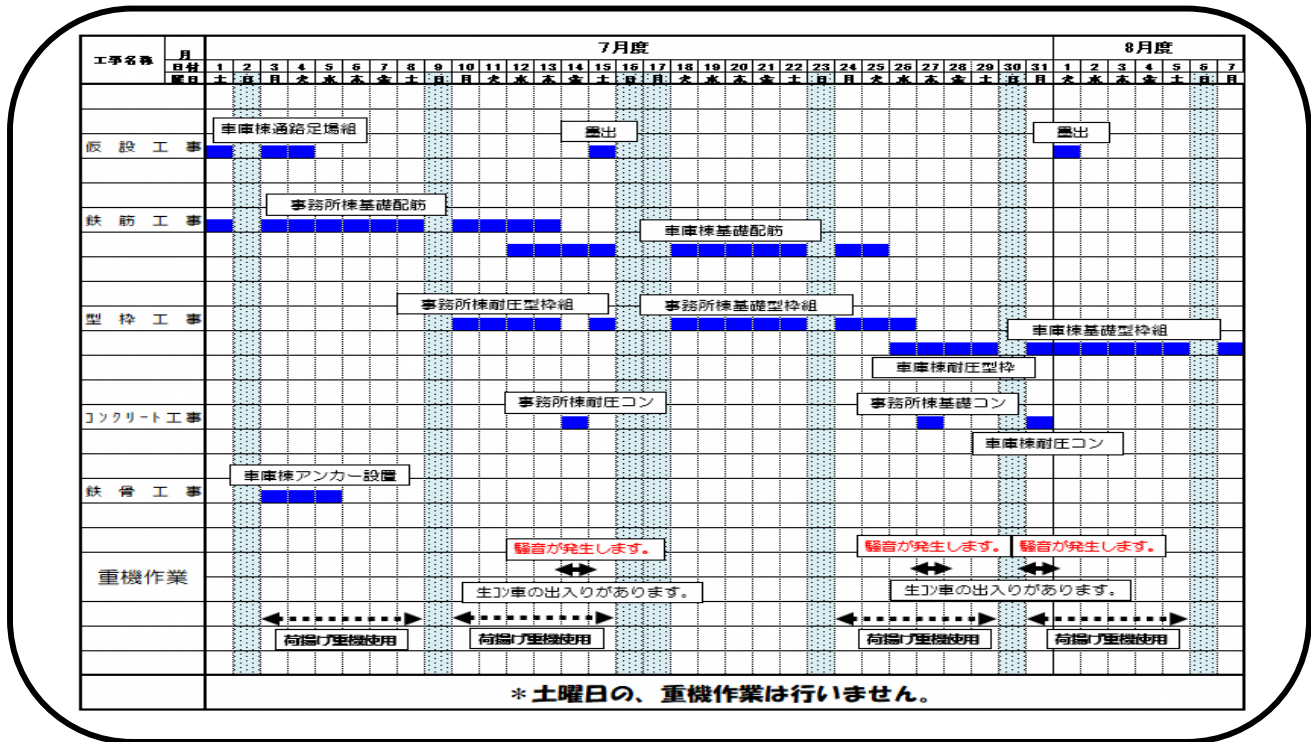

今月の主な工事

7月の主な工事は、基礎工事を予定しています。

1. 鉄筋工事：土台となる建物の基礎を鉄筋で組み立てる工事です。
2. 型枠工事：土台となる建物基礎の形状を作るため、型材を組み立てる作業です。
3. コンクリート工事：やわらかいコンクリートを型枠の中に流し込み土台を構築する作業です。
4. 鉄骨工事：車庫の基礎と鉄骨柱を繋ぐアンカーボルトを所定の場所に設置する作業です。

鉄筋・型枠・コンクリート工事



作業のイメージ写真

鉄筋工事

土台となる建物の基礎を強固なものにするため、骨組となる鉄筋を組み立てます。



作業のイメージ写真

型枠工事

土台となる建物の基礎の形状を作るため、型材を組み立てる作業です。型材で土台の骨組となる鉄筋を囲っていきます。



作業のイメージ写真

コンクリート工事

やわらかいコンクリートを型材で組み立てた(型枠)中に流し込み建物の土台となる基礎を構築する作業です。コンクリートを締め固めるため、振動機、型枠をたたく音などが発生します。

コンクリート工事中は、大型車両が多く出入りいたしますので、状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。
また、コンクリートを流し込む作業等は、できる限り時間内に終了するように努めてまいります。コンクリートを流し込む作業により5時を過ぎるおそれがありますので、ご了承をお願いいたします。
